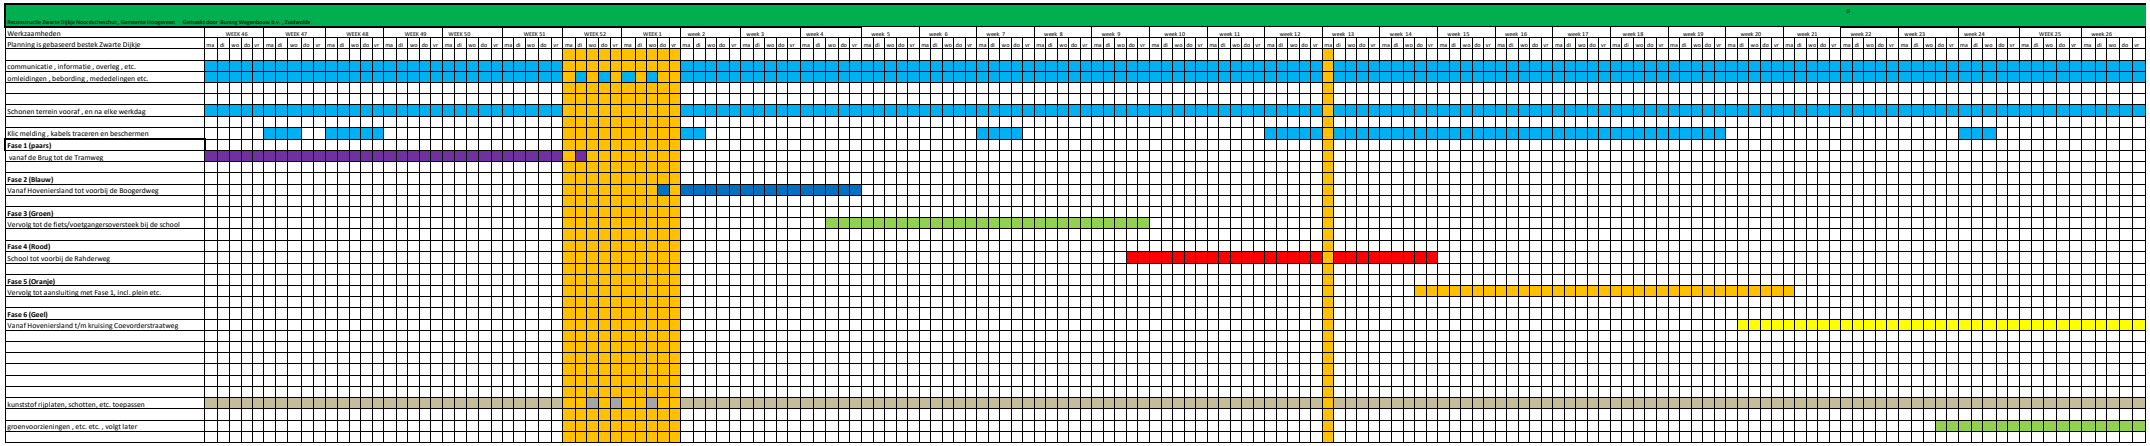
Reconstructie Zwarte Dijkje Noordscheschut , Gemeente Hoogeveen Gemaakt door: Buning Wegenbouw b.v. , Zuidwolde
0
Werkzaamheden
Planning is gebaseerd bestek Zwarte Dijkje
WEEK 46
WEEK 47
WEEK 48
WEEK 49
WEEK 50
WEEK 51
WEEK 52
WEEK 1
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
week 9
week 10
week 11
week 12
week 13
week 14
week 15
week 16
week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22
week 23
week 24
WEEK 25
week 26
communicatie , informatie , overleg , etc.
omleidingen , bebording , mededelingen etc.
Schonen terrein vooraf , en na elke werkdag
Klic melding , kabels traceren en beschermen
Fase 1 (paars)
vanaf de Brug tot de Tramweg
Fase 2 (Blauw)
Vanaf Hoveniersland tot voorbij de Boogerdweg
Fase 3 (Groen)
Vervolg tot de fiets/voetgangersoversteek bij de school
Fase 4 (Rood)
School tot voorbij de Rahderweg
Fase 5 (Oranje)
Vervolg tot aansluiting met Fase 1, incl. plein etc.
Fase 6 (Geel)
Vanaf Hoveniersland t/m kruising Coevorderstraatweg
kunststof rijplaten, schotten, etc. toepassen
groenvoorzieningen , etc. etc. , volgt later
